

## **COMPTE -RENDU DE LA REUNION SUR LES TESTS PARTIELS DU 0.5.87**

Présents: Y. Baconnier, B. Bleus, B. Boillot, M. Bouthéon, M. Bôle-Feysot, P. Bossard, L. Brouwers, M. Corcelle, G. Daems, L. Danloy, H. Dijkhuizen, B. Dumas, V. Glaus, J. Gruber, J. Jamsek, J. Robert, C. Saulnier, M. Thivent, J.C. Thomy, G. Serras, G. Rosset.

La réunion était utilisée pour l'examen des tests dans les semaines 21-22..

**Tests LINAC 1:** Demande de tests avec Oxygène. annulée.

**Tests LINAC 2:** Demande de tests RF pendant la semaine 21. Faisceau 50 MeV jeudi et vendredi.  
Demande de tests avec faisceau 50 MeV en semaine 22

**BOOSTER:** G. Daems demande à avoir des alimentations auxiliaires et leurs charges en marche pour la semaine 21.  
B. Dumas annonce les tests de l'aimant principal dès le 29 mai.

**PS:** Semaine 20: Fin des installations.

Semaines 21-22:**Lundi 18 mai.** Patrouille à 17h00. Contrôle électrique des portes.  
Tests d'isolation, puis tests d'alimentations.(principale, PFW, etc..)

**Mardi 19 mai.** Accès libre la journée. Patrouille à 17h00. Contrôle électrique des portes.  
Cette nuit est réservée pour les tests non terminés de la nuit précédente.

**Mercredi 20 mai.** Accès libre la journée. Patrouille à 17h00.  
Contrôle électrique des portes.  
Cav. 114 Mhz les tests à haut niveau ne sont pas compatibles avec les entrées dans l'anneau.  
Test en charge des alimentations auxiliaires, contrôle par ordinateur.

**Judi 21 mai.** Accès libre la journée. Patrouille à 17h00.  
Contrôle électrique des portes PS jusqu'au 27 mai.  
Suite des tests du mercredi.

**Vendredi 22 mai à mercredi 27 mai.**  
Suite des tests ci-dessus. Avec anneau PS à accès contrôlé continuellement depuis la salle de commande principale.  
Essai de l'aimant principal du PS avec cycle lourd durant le week-end.

Fin de semaine 22: Réserve.

**Zones TT2/10 &70:** Demande de tests pour FT 16 mais dans l'anneau PS. Ces tests seront possibles dès fermeture de l'anneau. Test du contrôle par ordinateur du 25 au 27 mai.  
Pour ses tests d'alimentations de TT2 (pendant la journée, avec anneau PS ouvert.) M. Corcelle doit consigner les alimentations qui débitent sur des éléments dans l'anneau PS.

**Salles de contrôle** PH: Rotation continue dès lundi 18 mai.  
MCR: Semaine 21: 17h00-08h00, et continue dès le jeudi soir.  
Semaine22: Continue (à confirmer pour la période du 28-31)

**Système de sécurité:** Les dates de mise à disposition des chaînes ont été fixées lors d'une précédente réunion. Cependant, il ne faut pas oublier qu'il faut du temps pour tester lorsque les premières patrouilles sont faites.

G.Rosset

Annexes: Plan semaines 21-22  
Schema standard de démarrage.

Distribution : Liste tests partiels.


---

**Prochaine: vendredi 15.5.87 .14h00 Salle des visiteurs MCR.**

---

**Distribution: Liste tests partiels.**

# SCHEMA STANDARD DE DEMARRAGE DU COMPLEXE PS

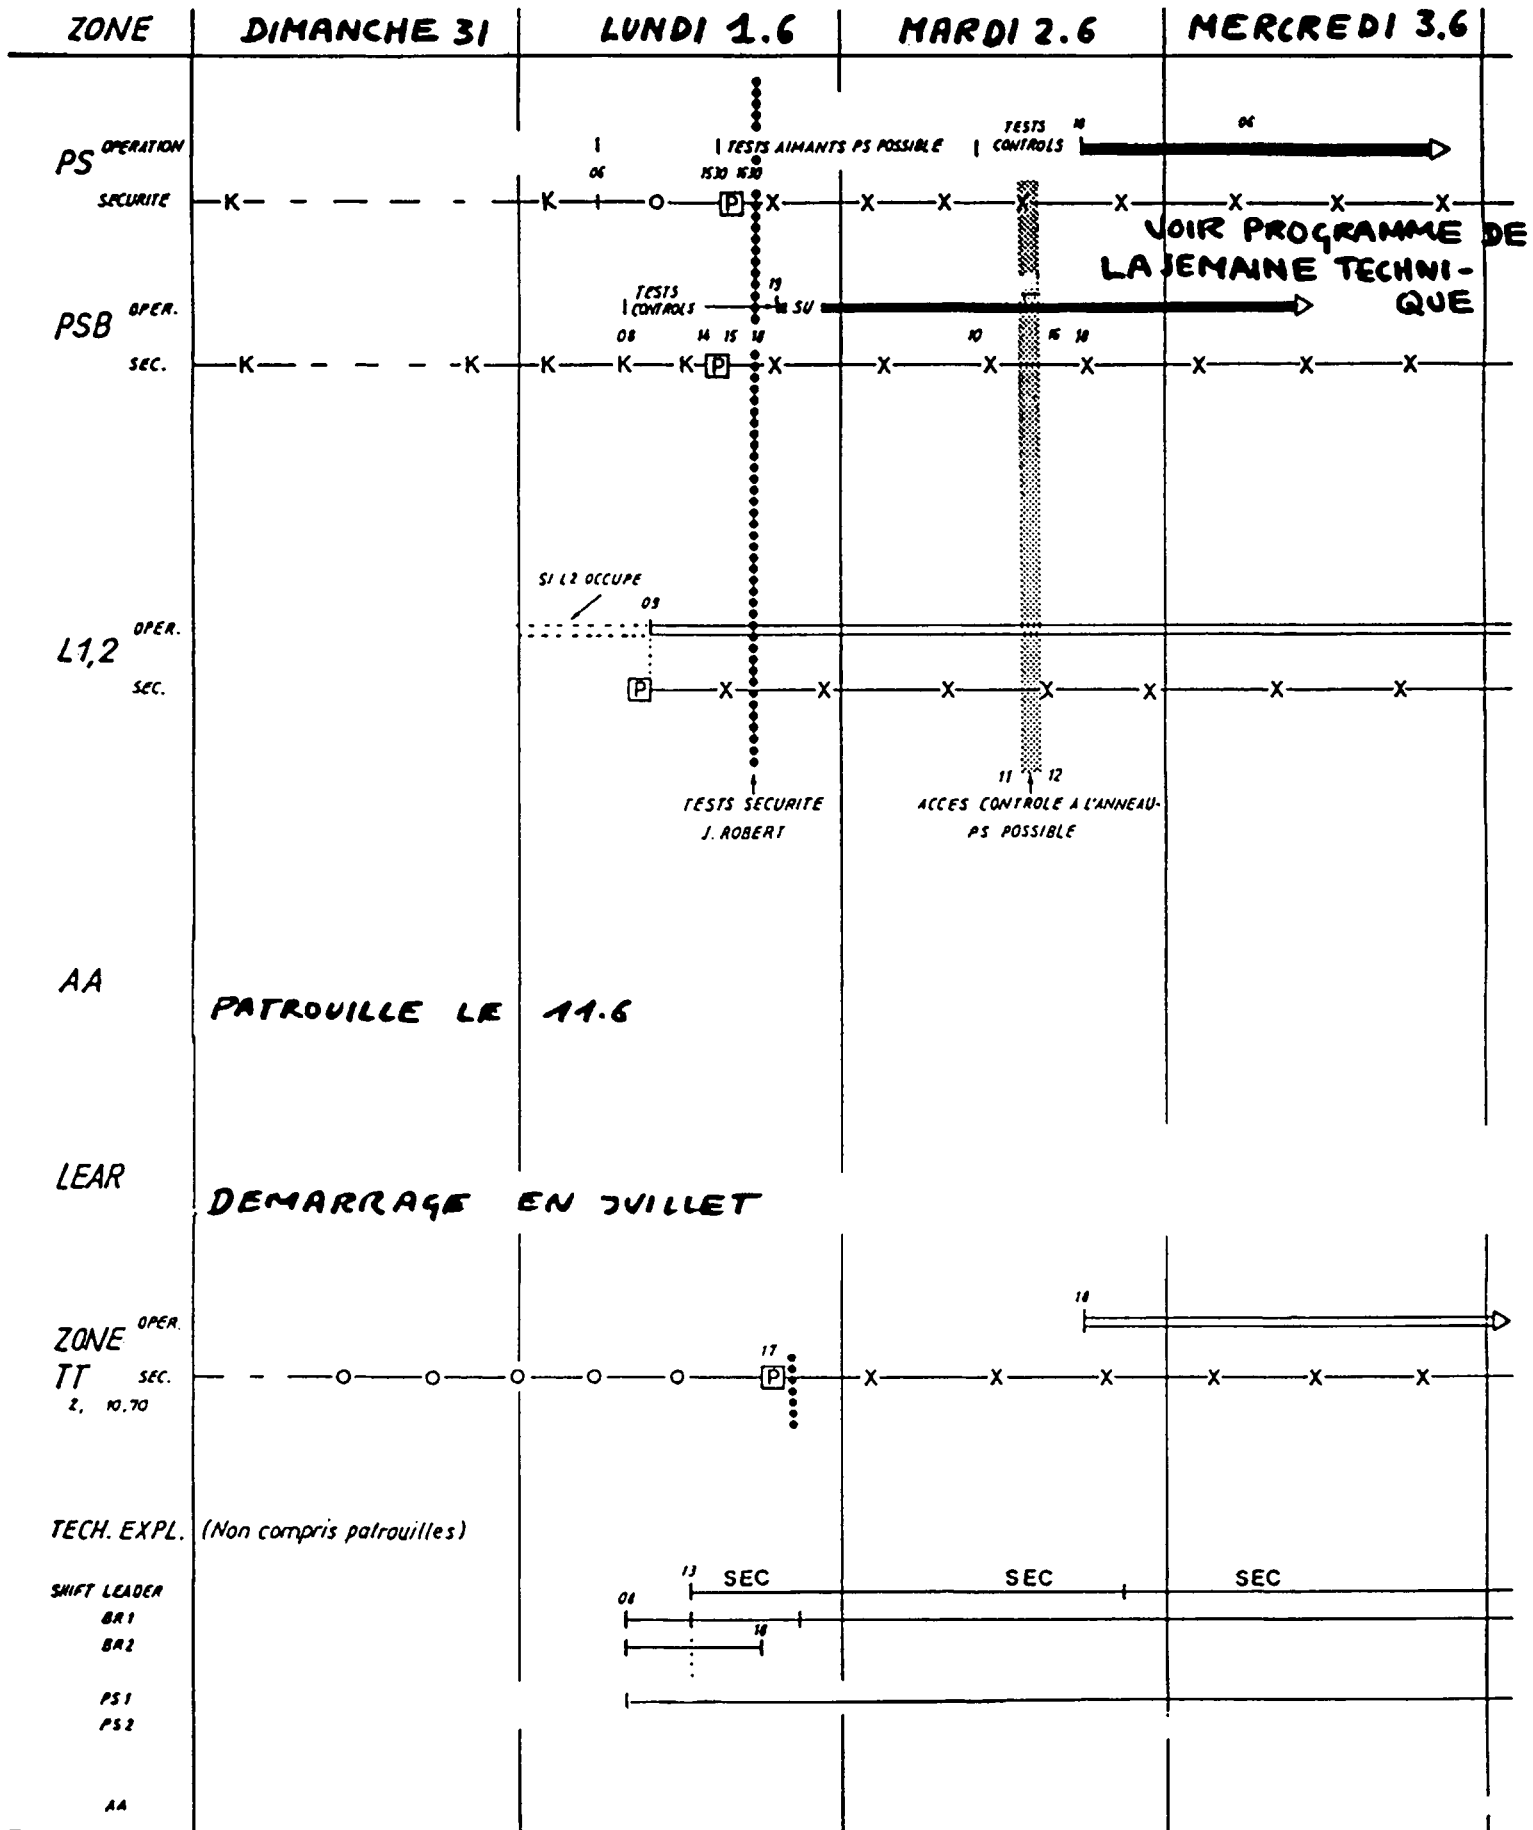

## LEGENDE

- K— FERMETURE A CLEF
- O— ZONE OUVERTE
- T— " VERROUILLAGE ELECTRIQUE POUR TESTS AIMANTS
- X— " " " AVEC FAISCEAUX POSSIBLES
- Ⓟ PATROUILLE TESTS FAISCEAUX
- Ⓜ PATROUILLE TESTS AIMANTS
- ▢ ME/MD
- ➡ FAISCEAU CONTINU POSSIBLE
- SEC RESPONSABLE SECURITE MCR

# TESTS PARTIELS - SEMAINES DU 18.5 AU 31.5.87.

Ascension

ACCES:	lundi 18	mardi 19	merc. 20	jeudi 21	vendr. 22	sam. 23	dim. 24	lundi 25	mardi 26	merc. 27	jeudi 28	vendr. 29	sam. 30	dim. 31
LINAC 1.....	KKKK	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT
LINAC 2.....	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT
LEAR.....	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT
BOOSTER RING.....	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT
PS RING.....	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT
TUNNEL...TT2	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT
LPI	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT	TTTT
<b>IESIS</b>														
Essais du LINAC 2 RF seulement.														
Essais du LINAC 2 avec faisceau 50MeV														
Essais du LPI avec faisceau														
BOOSTER. Controls et aimants auxiliaires.														
BOOSTER... Aimant principal.														
BOOSTER.....														
ANNEAU PS Essais d'isolation. Aimant, PFw, etc.														
ANNEAU PS Controls et aim. aux.														
ANNEAU PS Cavité 114Mhz														
ANNEAU PS Génératrice princ./aimant PS														
ANNEAU PS FT16+ FAS8 aimants dans le PS														
ANNEAU PS.....														
TT2/TT10.....														
TT2/TT10.....														
TT2/TT10.....														
TT70.....														
TT70.....														

TTTTT.....	Fermeture à verrouillage électrique pour test aimant.
KKKKKK.....	Fermeture à clef. (Pour le week-end par exemple.)
XXXXXXX.....	Fermeture à verrouillage électrique pour tests avec faisceau
-----	Non disponibilité d'un service ou d'un équipement.
---Y---	Moment où le service est à nouveau disponible
=====	Service disponible, test annoncé à l'avance.

5.5.1987

LISTE DE DISTRIBUTION DES TESTS PARTIELS

Chefs de Groupe PS

B. Allardyce	F. Bandi	P. Liénard
R. Billinge	B. Bleus	R. Luscher
Y. Baconnier	P. Bobbio	L. Magnani
O. Barbalat	B. Boileau	E. Malandain
M. Bouthéon	J. Boillot	P. Marti
L. Coull	D. Boimond	G. Martini
D.C. Fiander	M. Bôle-Feysot	P. Martucci
H. Haseroth	R. Bonzano	S. Maury
E. Jones	J. Boucheron	C. Mazeline
P. Lefèvre	R. Bourgeois	J.J. Merminod
J.H.B. Madsen	P. Bossard	K. Metzmacher
G. Nassibian	K. Braun	G. Nassibian
F. Perriollat	M. Brouet	B. Nicolai
P.L. Riboni	E. Brouzet	F. Nitsch
K. Schindl	L. Brouwers	J. Pasquali
D.J. Simon	P. Burla	P. Pearce
	A. Burlet	F. Pedersen
	J. Buttkus	J. Philippe
c.c. D. Dekkers	M. Chanel	R. Pittin
	E. Chevallier	A. Poncet
	J. Chevallier	N. Rasmussen
	P. Collet	R. Razurel/SB
	M. Corcelle	C. Renaud/HS
	D. Cornuet	A. Renou
	G. Daems	L. Rinolfi
	A. Daneels	T. Risselada
	L. Danloy	J.P. Riunaud
	L. Decurninge	D. Rivalli
	C. Dehavay	J. Robert
	J. Delaprisson	F. Rohner
	H. Dijkhuizen	G. Rosset
	B. Dumas	G. Roux
	B. Frammery	J.P. Royer
	J.Y. Freeman	C. Saulnier
	R. Gailloud	A. Scaramelli/SB
	G. Gelato	P. Schenkels
	C. Germain	J.D. Schnell
	V. Glaus	J.C. Schnuriger
	B. Godenzi	H. Schönauer
	J. Golliet	E. Schulte
	P. Gourcy	E. Sigaud
	D. Grier	D. Simon
	A. Grossmann	B. Szeless
	J. Gruber	M. Tardy
	J. Guillet	P. Tétu
	J.M. Hanon	M. Thivent
	L. Henny	J.C. Thomi
	P. Heymans	H. Ullrich
	C. Hill	R. Valbuena
	F. Hoekemeijer	W. Van Cauter
	F. Hoffmann	L. Veron/ST
	R. Hohbach	F. Volker
	L. Jeannerot	B. Williams
J. Knott	J. Jamsek	D.J. Williams
A. Krusche	M. Jenin/SB	E.J.N. Wilson
M. Lamidon	C.D. Johnson	M. Wyss/SB
P. Zettowch	I. Kamber	M. Zahnd/PS
