


# 主な発電所の復旧状況および見通し

参考資料 1

= 緊急設置電源

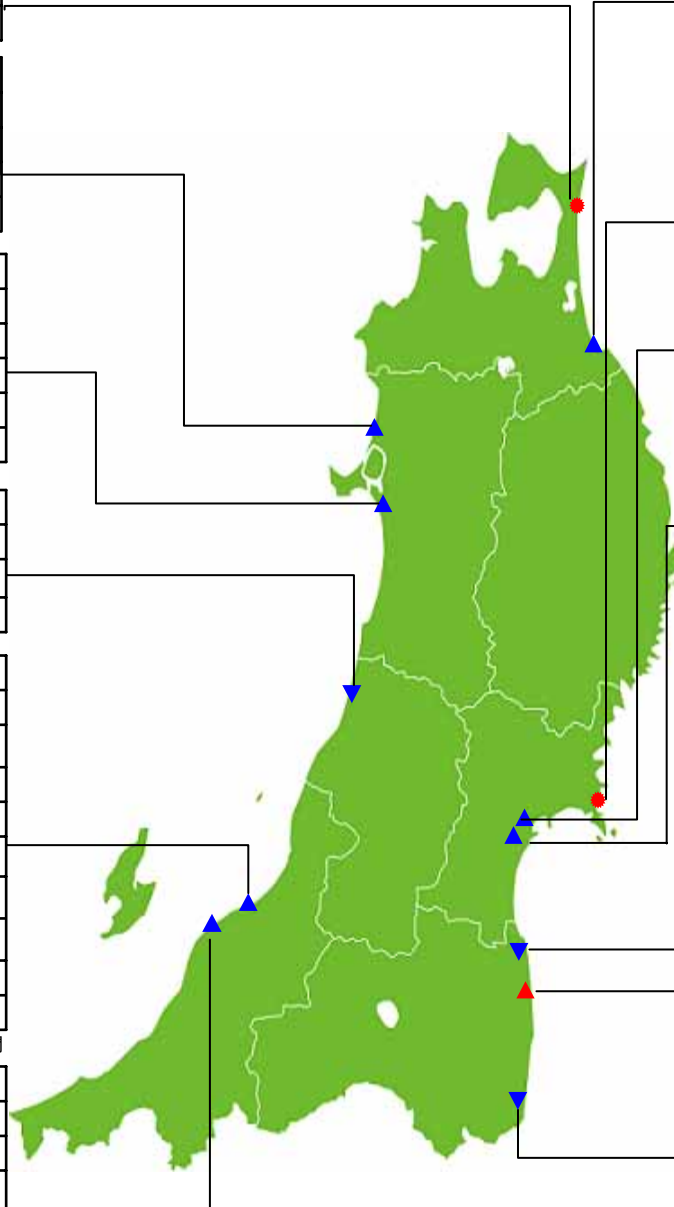

東通原子力発電所 (青森県下北郡東通村)			
運転状況	号機	出力	
停止中(定期検査中)	1号機	110万kW	

能代火力発電所 (秋田県能代市)			
運転状況	号機	出力	燃料
運転中	1号機	60万kW	石炭
運転中	2号機	60万kW	石炭
調整中	N A S 電池	8万kW	

秋田火力発電所 (秋田県秋田市)			
運転状況	号機	出力	燃料
運転中	2号機	35万kW	石油
運転中	3号機	35万kW	石油
運転中	4号機	60万kW	石油
H24.7運転開始予定	5号機	33.3万kW	石油

酒田共同火力発電所 (山形県酒田市)			
運転状況	号機	出力	燃料
運転中	1号機	35万kW(全量当社受電)	石炭
運転中	2号機	35万kW(全量当社受電)	石炭

東新潟火力発電所 (新潟県北蒲原郡聖籠町)			
運転状況	号機	出力	燃料
運転中	1号機	60万kW	LNG
運転中	2号機	60万kW	LNG
運転中	3号系列	121万kW	LNG
運転中	4号系列	170万kW	LNG
H24.7運転開始予定	5号機	33.9万kW	LNG
運転中	港1号機	35万kW	LNG
運転中	港2号機	35万kW	LNG
H23.8.26運転開始	港3号系列	5.38万kW	石油

平成22年4月から長期計画停止していたが、H23.5.31運転再開

新潟火力発電所 (新潟県新潟市)			
運転状況	号機	出力	燃料
運転中	4号機	25万kW	LNG
運転中	5号系列	10.9万kW	LNG
H23.12.28より試運転 H24.1末運転開始予定	6号機	3.4万kW	LNG

八戸火力発電所 (青森県八戸市)			
運転状況	号機	出力	燃料
H23.3.20運転再開	3号機	25万kW	石油
H24.7運転開始予定	5号機	27.4万kW	石油

H26.8 コンバインド化し、恒久的電源(出力約42万kW)とする

女川原子力発電所 (宮城県牡鹿郡女川町、石巻市)		
運転状況	号機	出力
停止中(定期検査中)	1号機	52.4万kW
停止中(定期検査中)	2号機	82.5万kW
停止中(定期検査中)	3号機	82.5万kW

仙台火力発電所 (宮城県宮城郡七ヶ浜町)			
運転状況	号機	出力	燃料
H23.12.20より試運転 H24.2上旬運転再開予定	4号機	44.6万kW	LNG

新仙台火力発電所 (宮城県仙台市)			
運転状況	号機	出力	燃料
H23.12.27運転再開	1号機	35万kW	石油
H28.7運転開始予定	3号系列	98万kWの半量	LNG
H29.7運転開始予定		98万kWの半量	

リプレース計画として11月30日新設工事着工

相馬共同火力発電 新地発電所 (福島県相馬郡新地町)			
運転状況	号機	出力	燃料
H23.12.27より試運転	1号機	100万kW(半量当社受電)	石炭
H23.12.19より試運転	2号機	100万kW(半量当社受電)	石炭

原町火力発電所 (福島県南相馬市)			
運転状況	号機	出力	燃料
H25年夏前までの 運転再開予定	1号機	100万kW	石炭
H25年夏前までの 運転再開予定	2号機	100万kW	石炭

常磐共同火力 勿来発電所 (福島県いわき市)			
運転状況	号機	出力	燃料
H24年夏までの 運転再開予定	6号機	17.5万kW (半量当社受電)	石油
H23.12.21運転再開	7号機	25万kW(半量当社受電)	石炭
H23.7.17運転再開	8号機	60万kW(半量当社受電)	石炭
H23.6.30運転再開	9号機	60万kW(半量当社受電)	石炭

H22.1から長期計画停止中
