



国土交通省東北地方整備局

Tohoku Regional Development Bureau

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

記者発表資料

令和6年11月14日  
東北地方整備局  
福島河川国道事務所

ふくしまにし

## 国道13号 福島西道路(Ⅱ期)の開通時期の見直しについて

- 国道13号 <sup>ふくしまにし</sup>福島西道路(Ⅱ期)(延長6.3km)は、令和8年度の開通を目指し、盛土工事や橋梁上部工工事、トンネル工事など、全面的に工事を進めているところです。
- このうち、施工中の(仮称)<sup>あさかわ</sup>浅川トンネルでは、当初の想定を超える巨礫等が出現し、<sup>きよれき</sup>発破による破砕作業が追加になるなど、工事に時間を要しているところです。
- 必要な騒音・振動対策を行い、施工効率の向上に努めてきたところですが、現時点のトンネル工事の施工実績から、今後予定されている残工事量を精査すると令和8年度開通としていた開通時期の見直しが必要と判断したところです。
- なお、見直し後の開通時期については、今後のトンネル工事の進捗を踏まえて工程を精査し、改めてお知らせいたします。

### ■開通時期の見直し

<現在>

令和8年度開通予定

⇒

<見直し後>

開通時期については、トンネル  
工事の進捗を踏まえて精査

【記者発表先】:福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ

<問い合わせ先>

国土交通省 東北地方整備局 福島河川国道事務所

電話 024-546-4331(代表)

副 所 長(道路)

工 務 第 二 課 長


いわがち けんいち

岩 淵 賢一(内線 205)


あらかや よしなり

荒 谷 義成(内線 411)


# 一般国道13号 福島西道路

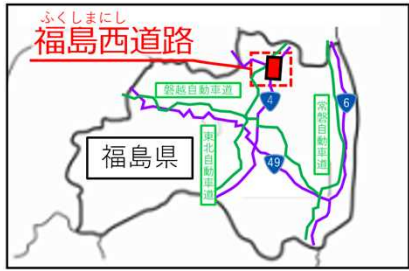

<(仮)浅川トンネル標準横断面図>




上り線



下り線  
※施工中

- 対象路線
- - - 対象路線(事業中)
- 高規格道路
- 直轄国道(国管理)
- 補助国道(県管理)
- 主要地方・一般県道
- 交差点

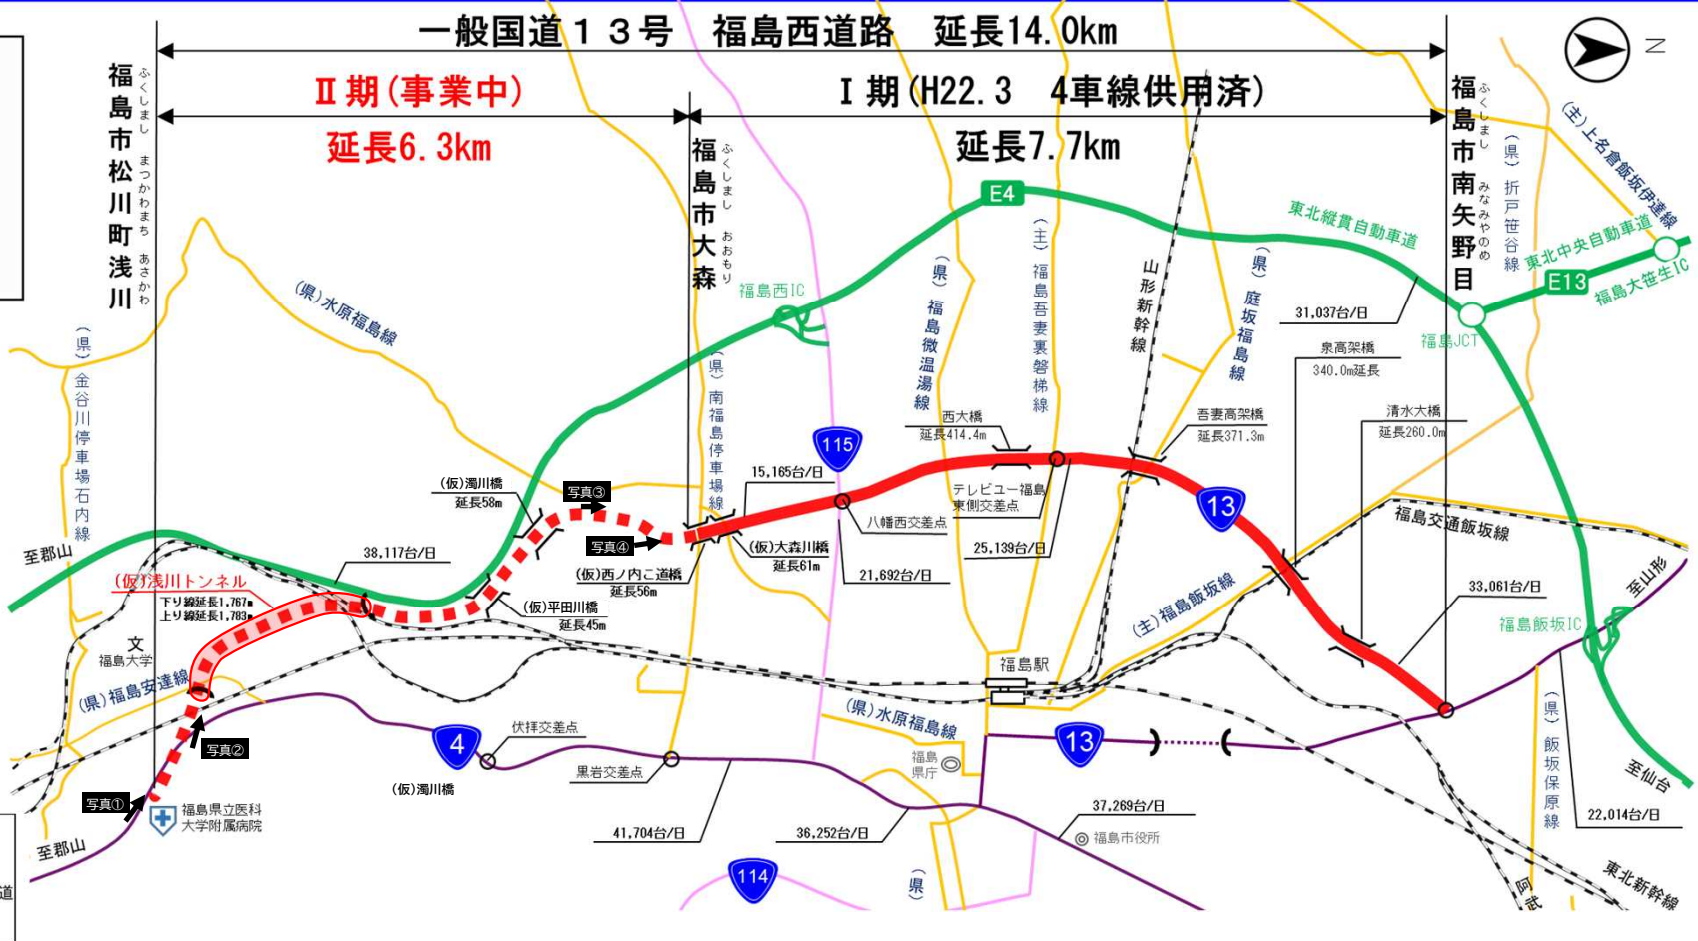

▲起点国道4号との接続部施工状況



▲(仮)浅川トンネル起点側坑口施工状況



▲盛土区間施工状況



▲(仮)西ノ内こ道橋施工状況



# (仮) 浅川トンネルにおける施工状況

- 令和5年10月より掘削を開始した(仮)浅川トンネルにおいて、想定を超える大きさの巨礫が多く出現し、発破による巨礫等の破碎作業が追加
- 騒音・振動対策を行いながら工事を進めているが、当初計画に対し時間を要している状況

## ■巨礫破碎などの施工計画

